


**COMUNE DI  
VALVA  
PROVINCIA DI SALERNO**



**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN  
SICUREZZA DELLA "STRADA COMUNALE DESERTE"**

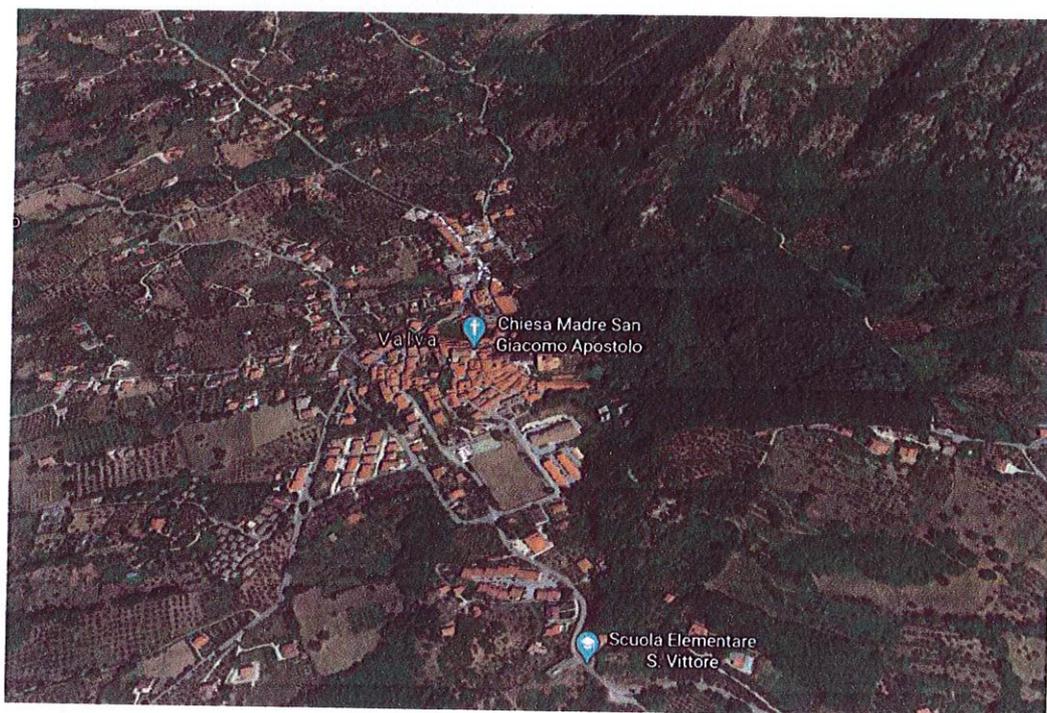

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Carmine MALPEDE

**Il Sindaco:**

Prof. Vito Falcone

ELABORATI:

MARZO 2020

**E.C.1 - Cronoprogramma dei Lavori**

COMUNE DI VALVA (SA)

“Interventi Di Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Della Strada Comunale Deserte”

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

EDIZIONE 1.1 - Aggiornamento Marzo 2020

DESCRIZIONE ATTIVITA' / GIORNI	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
--------------------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1 ORGANIZZAZIONE CANTIERE (recinzioni, allacciamenti, baraccamenti, sicurezza, primi approvvigionamenti, rilievi, ecc.)	■																	
2 DEMOLIZIONI E SCAVI (demolizioni, tagli, scavi, pulizia cunette, fresatura e trsasporto a rifiuto)		■	■	■														
3 ESECUZIONE OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E DELIMITAZIONI (realizzazione delle zanelle e cordoli in c.c.a., degli attraversamenti e opere a bordo strada)				■	■	■	■	■										
4 INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA									■	■	■							
5 PAVIMENTAZIONI (Posa in opera di misto stabilizzato, rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso)												■	■	■	■	■		
6 SEGNALETICA STRADALE E BARRIERE (Posa in opera delle barriere di sicurezza e della segnaletica)																	■	■
7 ULTIMAZIONE LAVORI (verifiche finali, misurazioni, verbale di ultimazione lavori, ecc.)																		■

ESECUZIONE DELLE OPERE - ULTIMAZIONE LAVORI

85 GIORNI

Valva, SA, Marzo 2020
